

Anfrage

Bestellung

Absender

Bauunternehmer

Planer/Architekt

Händler

Außendienstmitarbeiter

Name

Ausschreibung

Bedarf

Bauvorhaben

gewünschter Liefertermin

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Lieferadresse (falls abweichend)

Ansprechpartner

e-Mail




Telefon

Telefax

**Lichtschaft
GFB Optimus®**

**Betonlichtschacht
Standard**

**Betonlichtschacht
Standard Maxi/Mini**

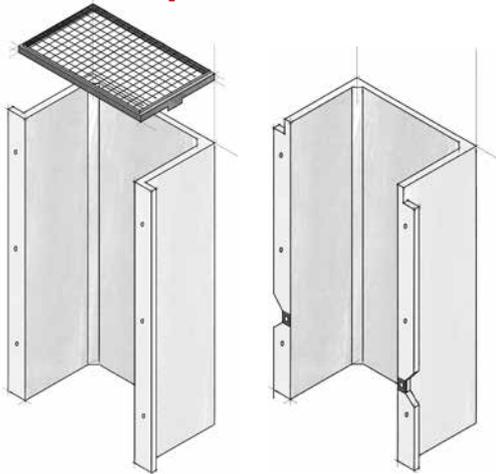

ohne Aufhängung mit Aufhängung

Menge und Abmessungen (Angewebenen Maße sind lichte ca. Maße)

Pos.	Menge in Stück	Breite (B) in cm	Wandabstand (T) in cm	Höhe (H) in cm
1				
2				
3				
4				
5				

Größen Optimus®

B: 80 / 100 / 125 cm

T: 50 cm

H: 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm

Größen Standard

B: 80 / 100 cm

T: 51 cm

H Grundelement: 40 / 50 cm / 50 cm PLUS

H Aufsätze: 10 / 15 / 20 / 25 / 33 / 40 / 50 cm

Größen Standard Maxi / Mini

B: 60 / 125 / 150 / 200 cm

T: 50 cm

H Grundelement: 40 / 50 cm

H Aufsätze: 10 / 15 / 20 / 30 / 50 cm

Ausführung/Variante

<input type="checkbox"/> ohne Boden	<input type="checkbox"/> mit Boden	<input type="checkbox"/> ohne Ablauf	<input type="checkbox"/> mit Ablauf
<input type="checkbox"/> Befestigung GFB Optimus[®] mittels verlängerter Dübel ab 180 cm Höhe 3 Befestigungen	<input type="checkbox"/> auf Beton	<input type="checkbox"/> auf Dämmung für Dämmstärke: <input type="checkbox"/> 6 cm <input type="checkbox"/> 8 cm <input type="checkbox"/> 10 cm <input type="checkbox"/> 12 cm <input type="checkbox"/> 14 cm <input type="checkbox"/> 16 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 20 cm	
<input type="checkbox"/> Befestigung Standard mittels Verlängerungslasche und Dübel. Nur bei systemunabhängiger Montage. (Bei HIEBER [®] Kellerfenstersystem nicht notwendig.)	<input type="checkbox"/> auf Beton	<input type="checkbox"/> auf Dämmung für Dämmstärke: <input type="checkbox"/> 6 cm <input type="checkbox"/> 8 cm <input type="checkbox"/> 10 cm <input type="checkbox"/> 12 cm <input type="checkbox"/> 14 cm <input type="checkbox"/> 16 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 20 cm	
<input type="checkbox"/> Befestigung Standard Maxi / Mini mittels verlängerter Winkel (wie Unimax)	<input type="checkbox"/> auf Beton	<input type="checkbox"/> auf Dämmung für Dämmstärke: <input type="checkbox"/> 6 cm <input type="checkbox"/> 8 cm <input type="checkbox"/> 10 cm <input type="checkbox"/> 12 cm <input type="checkbox"/> 14 cm <input type="checkbox"/> 16 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 20 cm	
<input type="checkbox"/> Auflagewinkel empfohlen ab 140 mm Dämmung	für Dämmstärke: <input type="checkbox"/> 14 cm <input type="checkbox"/> 16 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 20 cm		

Aufsätze


<input type="checkbox"/> GFB Optimus[®] Aufsatz (ab 10 cm bis 50 cm Höhe in 1 cm Schritten)	Höhe in cm:	zu Pos.:
---	--------------------	-----------------

Gitterroste


<input type="checkbox"/> für GFB Optimus [®]	<input type="checkbox"/> für Standard	<input type="checkbox"/> für Standard Maxi / Mini	
<input type="checkbox"/> begehbar	<input type="checkbox"/> Masche 30/10 zu Pos.:	<input type="checkbox"/> Masche 30/30 zu Pos.:	
<input type="checkbox"/> PKW-befahrbar 500 kg Radlast	<input type="checkbox"/> Masche 30/10 zu Pos.:	<input type="checkbox"/> Masche 30/30 zu Pos.:	<input type="checkbox"/> Masche 20/20 zu Pos.: bei Standard Maxi / Mini
<input type="checkbox"/> LKW-befahrbar 5 to Radlast	<input type="checkbox"/> Masche 30/10 zu Pos.:	<input type="checkbox"/> Masche 30/30 zu Pos.:	

Zubehör

<input type="checkbox"/> Sicherungsketten	<input type="checkbox"/> Sicherungsketten schnell lösbar für Notausstiegsschacht	<input type="checkbox"/> Einbruchssicherung mit Sicherungsteller
---	--	--



Sicherungsketten



Einbruchssicherung

Bestätigung

HIEBER[®] Außendienstmitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Absender:

Anfrage/Bestellung per E-Mail an info@hieber-beton.de
